


#### (13)工事：床塗装


##### 一床塗装ー 2020.1.30

無垢の杉フローリングに木材保護塗料であるバトン塗料を塗布。  
塗布するにあたり、養生をすべて撤去し、清掃を行う。接  
着剤や塗壁材の汚れが少しあったため、ペーパー掛けも  
行った。


コテ刷毛やスポンジに塗料をしみ込ませ、フローリングの  
目に沿って塗布していく。少し時間をおいてから、ウエス  
を使って塗り込んで、余分な部分の拭き取りを行った。



①養生を撤去し、清掃



②フローリングの目  
に沿って木材保護塗  
料（バトン）を塗布



##### 今回使用した道具と材料


- ・コテ刷毛、受け皿
- ・スポンジ
- ・ウエス
- ・木材保護塗料  
(VATON)




## (14)工事：玄関ホール 壁板張り

### 一 玄関ホール 壁板張りー 2020.2.17


玄関ホールの壁の一部をアクセントに木板張りとした。  
圧密加工されたw210×h90×t3mmの杉板のパネルを壁の割付を考え、下から順番に貼った。重ね代を15mm設け重なる部分にフィニッシュネイルで板を留め、うろこ張りのような仕上げとした。壁の両端や、窓枠、建具枠との取り合い部分はサイズに合わせてカットし、細かな加工が難しかったが、割と容易に施工することができた。



①圧密加工された杉板  
(w210×h90×t3mm) を張っていく  
ために割付を検討する

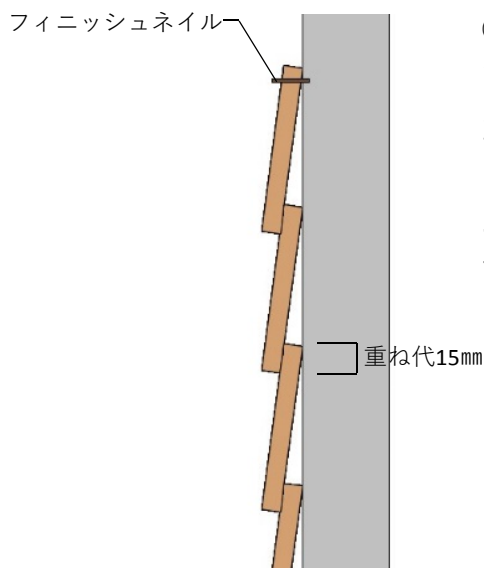


②一段ずつ両面テープで仮留めをし、フィニッシュネイルを用いて張っていく  
重ね代15mm設ける為、フィニッシュネイルは隠れるように留めていく  
一段張り終わったら、軽く木材保護塗料（バトン）を塗布  
この繰り返しを行う

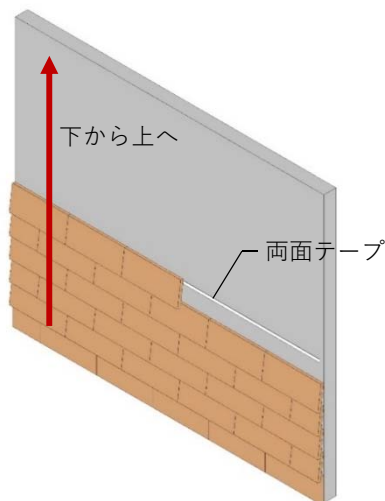

#### 今回使用した道具と材料

- ・フィニッシュネイル・
- ・両面テープ
- ・杉板（約3mm）
- ・木材保護塗料（VATON）
- ・ウエス





#### (15)完成披露会

ー完成披露会ー 2020.2.28 13:30~14:30

生活のイメージがしやすくなるように家具や照明を設置し、完成披露会を行った。

参加者は今回の空き家リノベーションを中心となって進めてきた、学生5名と教員3名、各務原市の担当課、各務原市空き家リノベーション事業推進会議会員の民間の工務店、設計事務所、空き家の所有者の方々である。

ここまでに至る計画の過程や、携わった工事をスライドと動画を交えて、学生による説明を行った。空き家の所有者の方をはじめ、リノベーション前後の大きな変化に大変驚かれ、感激された。



中日新聞 2020年2月29日（土）

## 空き家再生モダン住宅

各務原 岐阜女子大生デザイン

各務原市鵜沼南町にある築五十年の空き家が、岐阜女子大（岐阜市）の学生のアイデアで現代的な住宅に生まれ変わった。

二十八日、お披露目会があり、同大三年の大竹花奈さん（三）は「和風モダンをイメージしてデザインした。女性に気に入ってもらえる家になったと思う」と話した。

空き家の有効活用に取り組み各務原市と、同大で住

居学を専攻する学生らなどによるプロジェクトの一環で、昨年に続き二軒目。

今回手掛けた建物は、床面積約六十五平方メートルの木造平屋で、2Kの住戸二軒が連なる長屋。学生らは住戸を隔てる壁を取り払い、シェアハウスとしても使える3LDKのデザインを考案した。市内の工務店の協力を得て、昨年十二月から断熱材や床を貼ったり、壁を塗ったりして工事を進めて



リノベーションの成果を披露する女子大生ら＝各務原市で

きた。  
この住宅は、市や民間企業でつくる「空き家リノベーション推進会議」の会員

企業が借り受け、入居者を募る。  
（大山弘）



—完成写真—

